


PRIMAVERA P6

PLANIFICACIÓN DE ELITE

NIVEL 1: PLANNING MASTER

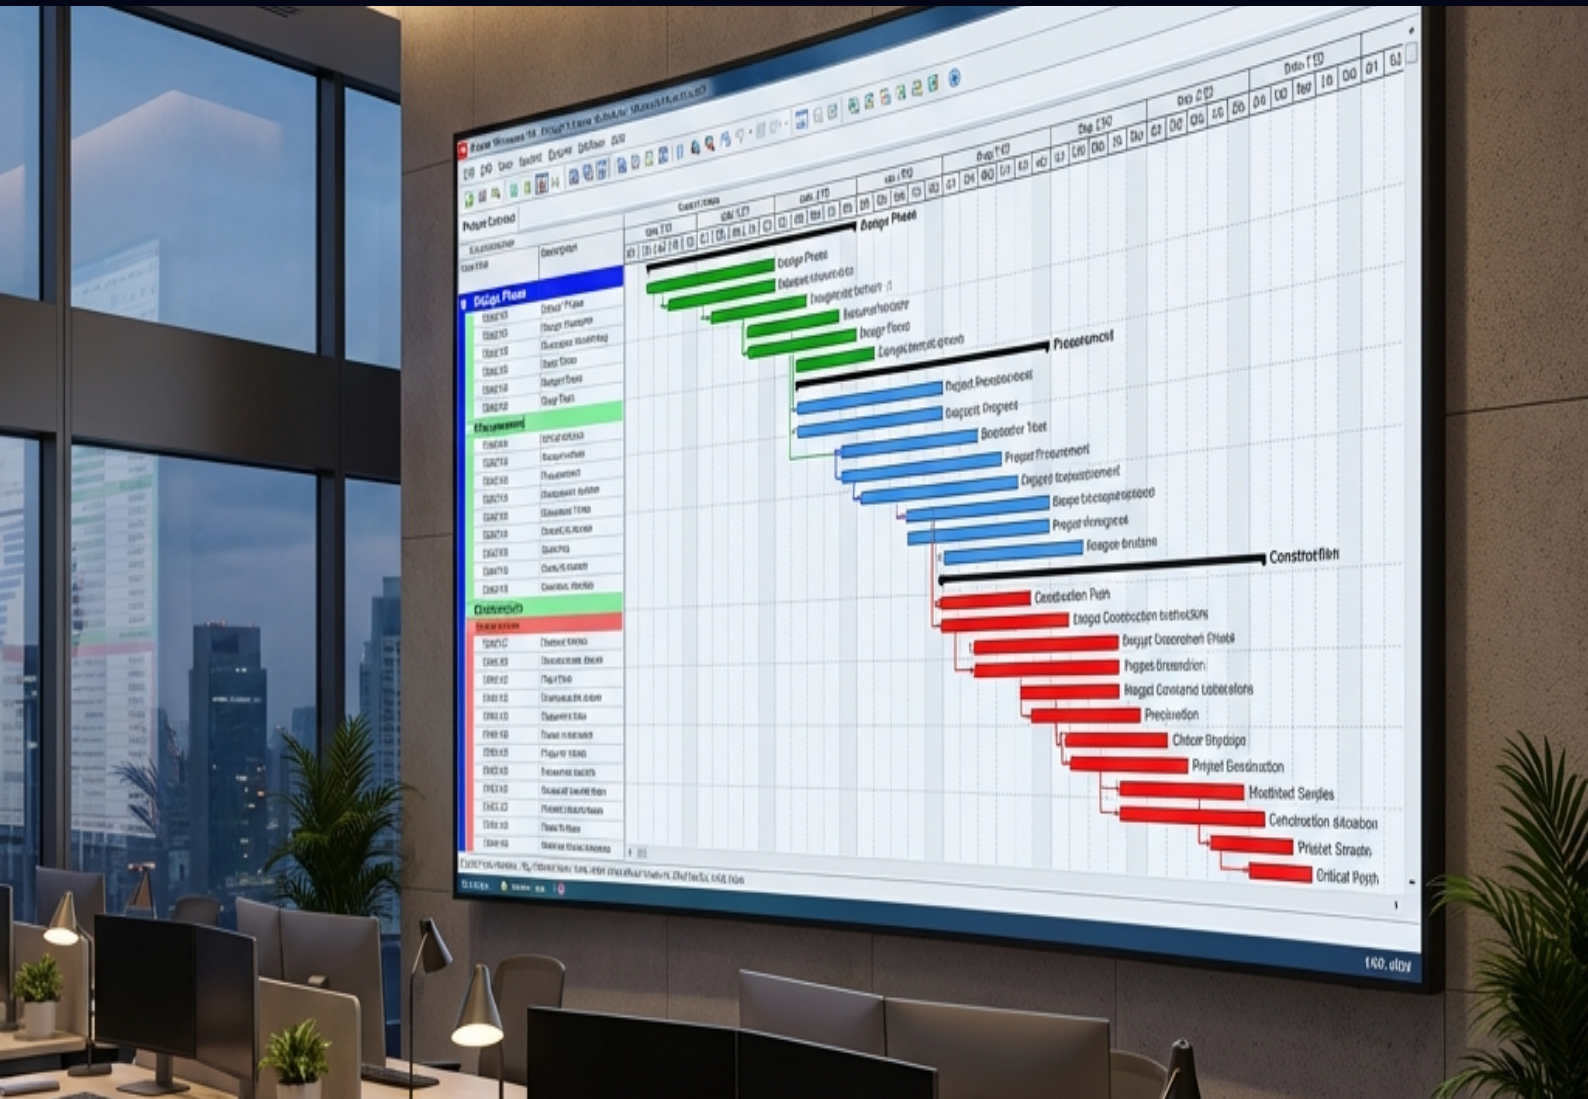

Domina el estándar global de la industria para el control de cronogramas en mega-proyectos.

Instructor: Ing. Mario Huilca

OBJETIVO DEL CURSO

De la Teoría a la Práctica Real.

Al concluir el curso, el estudiante será capaz de planificar, desarrollar, controlar y reportar proyectos utilizando Primavera P6, aplicando metodologías de programación, gestión de recursos, análisis de valor ganado, creación de líneas base y curvas S, así como técnicas de seguimiento y control para la toma de decisiones en proyectos reales.

¿POR QUÉ PRIMAVERA P6?

El software predilecto por las grandes empresas:

Gestión Multi-Proyecto

Organiza EPS y OBS para controlar portafolios enteros de construcción.

Lógica CPM Avanzada

Cálculo preciso de holguras y ruta crítica en cronogramas de miles de actividades.

Control de Recursos

Asignación dinámica y nivelación de HH y maquinaria para evitar cuellos de botella.

Curvas de Avance

Generación automática de Curvas S y análisis de Valor Ganado (EVM).

SÍLABO: 5 SESIONES PRÁCTICAS

SESIÓN 01: Introducción y Estructura Organizacional

Contenido: Estructura Empresarial de Proyectos (EPS), OBS, creación de proyectos y configuración de calendarios.

Práctica: *Definición del WBS y organización del diccionario de actividades.*

SESIÓN 02: Desarrollo del Cronograma (CPM)

Contenido: Configuración de actividades, tipos de duración y relaciones entre tareas (FS, SS, FF, SF) con Lags.

Práctica: *Revisión de un caso real según sus tipos de enlaces y lógica de red.*

SESIÓN 03: Gestión de Recursos y Valor Ganado

Contenido: Diccionario de recursos, asignación dinámica y conceptos fundamentales de Earned Value Management.

Práctica: *Ingreso de un paquete de recursos al caso práctico del proyecto.*

SESIÓN 04: Líneas Base y Reportería (Curva S)

Contenido: Creación de líneas base, informes de avance y configuración de Layouts profesionales.

Práctica: Generación de múltiples líneas base y exportación a Excel para modelado de Curva S.

SESIÓN 05: Seguimiento, Control y Forecast

Contenido: Carga de porcentajes de avance, Forecast por actividad y uso de filtros/Activity Codes.

Práctica: Simulación real de seguimiento y control de un proyecto en ejecución.

INFRAESTRUCTURA

Herramientas que dominarás:

Software Principal

Oracle Primavera P6 Professional.

Visualización

Dashboards en Excel y Reportes nativos.

Metodología

EVM (Earned Value Management) y CPM.

Analítica

Filtros complejos y Activity Codes para Big Data.

CERTIFICACIÓN OFICIAL

Especialista en Planificación con Primavera P6

DETALLES DEL INICIO

FECHA INICIO	Viernes 13 de Febrero 2026
HORARIO	Viernes y Sábados: 7:00 PM - 10:00 PM
DURACIÓN	5 sesiones de 3 horas (15h Totales)
INVERSIÓN	S/ 200 \$65
INSTRUCTOR	Ing. Mario Huilca
WHATSAPP	+51 993147501

IMPORTANTE: La instalación del software es de entera responsabilidad del alumno. Al ser clases virtuales, es requisito indispensable contar con el software instalado antes del inicio de la primera sesión.

¡RESERVA TU CUPO!

CONTACTO PROJECT CONTROL IA

Web: aureliosrios.github.io/project-control-ai

WhatsApp: +51 993147501

*Lleva tus cronogramas al siguiente nivel con rigor técnico y
estándares de ingeniería mundial.*
